
ID	Kegiatan	Duration	Start	Finish	Predecessors
1	**A**	**5 days**	**Wed 01/04/09**	**Mon 06/04/09**	
2	A1	3 days	Wed 01/04/09	Fri 03/04/09	
3	A2	2 days	Fri 03/04/09	Sat 04/04/09	2SS+2 days
4	A3	3 days	Fri 03/04/09	Mon 06/04/09	2SS+2 days;3SS
5	**B**	**3 days**	**Mon 06/04/09**	**Wed 08/04/09**	
6	B1	3 days	Mon 06/04/09	Wed 08/04/09	4SS+2 days
7	B2	2 days	Tue 07/04/09	Wed 08/04/09	6SS+1 day
8	**C**	**5 days**	**Wed 08/04/09**	**Mon 13/04/09**	
9	C1	3 days	Wed 08/04/09	Fri 10/04/09	7SS+1 day
10	C2	3 days	Fri 10/04/09	Mon 13/04/09	9SS+2 days
11	**D**	**5 days**	**Mon 13/04/09**	**Fri 17/04/09**	
12	D1	3 days	Mon 13/04/09	Wed 15/04/09	10SS+2 days
13	D2	2 days	Wed 15/04/09	Thu 16/04/09	12SS+2 days
14	D3	2 days	Thu 16/04/09	Fri 17/04/09	13SS+1 day
15	**E**	**3 days**	**Fri 17/04/09**	**Mon 20/04/09**	
16	E1	1 day	Fri 17/04/09	Fri 17/04/09	14SS+1 day
17	E2	1 day	Sat 18/04/09	Sat 18/04/09	16SS+1 day
18	E3	1 day	Mon 20/04/09	Mon 20/04/09	17SS+1 day
19	**F**	**3 days**	**Tue 21/04/09**	**Thu 23/04/09**	
20	F1	3 days	Tue 21/04/09	Thu 23/04/09	18SS+1 day
21	F2	3 days	Tue 21/04/09	Thu 23/04/09	20SS;18SS+1 day
22	**G**	**1 day**	**Thu 23/04/09**	**Thu 23/04/09**	
23	G1	1 day	Thu 23/04/09	Thu 23/04/09	20SS+2 days;21SS+2 days

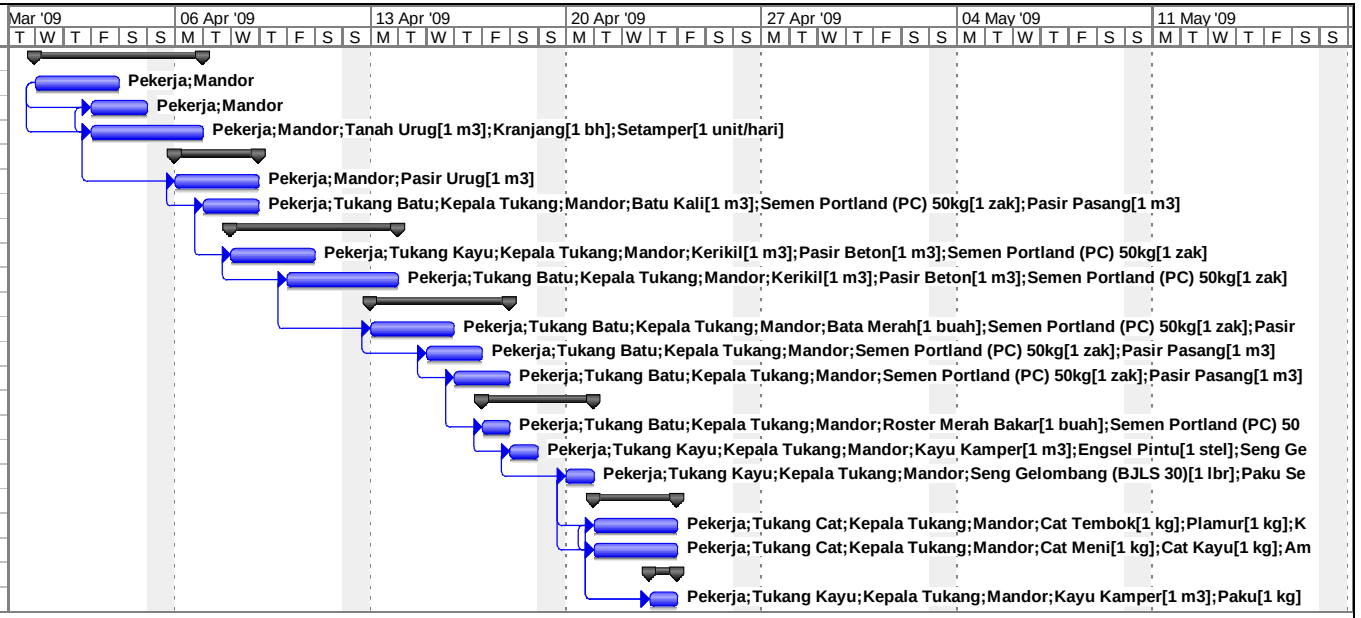

Project: PDM 100%
Date: Tue 16/08/11

Task | Progress | Summary | External Tasks | Deadline
Split | Milestone | Project Summary | External Milestone
